AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - Direzione 5° Tronco
AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI - progr. Km 479+499, Comune di Giove(TR)
Interventi di ripristino del cavalcavia di svincolo di Attigliano alla progr. Km 479+499

CONSEGNA LAVORI xx/xx/2016 — **LUGLIO 2016**

N.ord.	Descrizione attività	Durata gg.
1	**CARREGGIATA SUD**	
2	**Chiusura permanente corsia di accelerazione**	**12**
3	Posa di new jersej a protezione e Smontaggio lama barriera esistente	1
4	Montaggio dei ponteggi	2
5	Idrodemolizione pile pulvini carreggiata	5
6	Montaggio armatura e Ripristino Pile e pulvini	9
7	**Chiusura temporanea notturna corsia di sorpasso**	**5**
8	Idrodemolizione travi e impalcato	4
9	Lavori di ripristino travi e impalcato	4
10	**Chiusura giornaliera in notturno corsia di marcia**	**3**
11	Idrodemolizione travi e impalcato	2
12	Lavori di ripristino travi e impalcato	2
13	**Chiusura giornaliera corsia di marcia**	**3**
14	Rimontaggio lama barriera esistente e rimozione new jersei a protezione, smobilizzo cantiere	3
15	**CARREGGIATA NORD**	
16	**Chiusura permanente corsia di emergenza**	**21**
17	Posa di new jersej a protezione e Smontaggio lama barriera esistente	2
18	Montaggio dei ponteggi	2
19	Idrodemolizione pile pulvini carreggiata	6
20	Montaggio armatura e Ripristino Pile e pulvini	11
21	**Chiusura giornaliera notturna corsia di sorpasso**	**5**
22	Idrodemolizione travi e impalcato	4
23	Lavori di ripristino travi e impalcato	4
24	**Chiusura giornaliera in notturno corsia di marcia**	**3**
25	Idrodemolizione travi e impalcato	2
26	Lavori di ripristino travi e impalcato	2
27	**Chiusura giornaliera corsia di marcia**	**4**
28	Rimontaggio lama barriera esistente e rimozione new jersei a protezione, smobilizzo cantiere	3
	TOTALE DURATA LAVORI	**21**

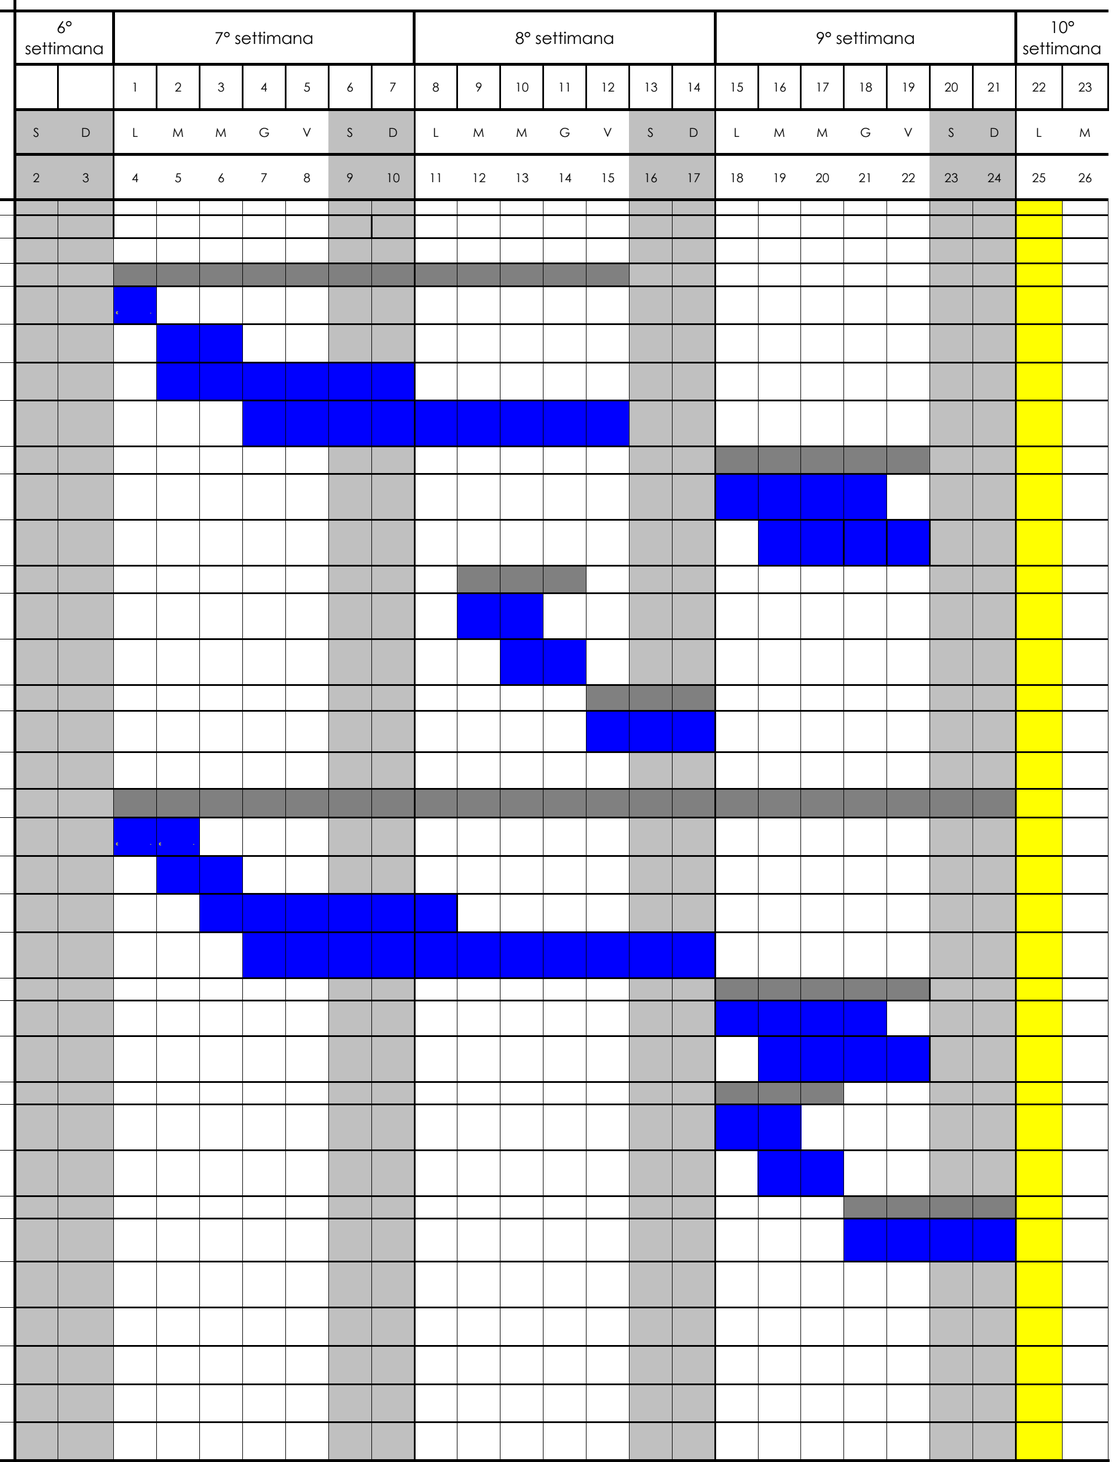

Amministrazione Provinciale di Rieti - arrivo - Prot. 27792/PROT del 19/09/2017 - titolo VI - classe 07
